

Lanzamiento Kit Robótica Hogareño: Fase 1

De la lógica institucional a un producto escalable, replicable y viable con el stock actual.



Objetivo

Presentar propuesta viable para el hogar. Salir al mercado, validar, aprender y reinvertir.



Premisa

No buscamos cerrar "el producto ideal a futuro", sino validar el modelo inicial y destrabar el plan de trabajo inmediato.



Meta de la Reunión

Validar alcance, precio, modelo comercial y próximos pasos.

Enfoque Estratégico: Lanzar Rápido, Evolucionar Después

Fase 1 (El producto de hoy)



Enfoque: Lanzamiento rápido.



Componentes: Kit centrado en servomotores y stock actual de placas (sin motores de tracción/pelea).



Proyectos con el kit: radar, barrera, estructuras de precisión.



Ventaja: Evita cuellos de botella en compras críticas; resuelve compatibilidad inmediata.


Fase 2 (La evolución futura)



Enfoque: Crecimiento y escalabilidad.



Componentes: Nueva placa, mayores prestaciones ('Upgrades').



Proyectos con el kit: Robótica móvil, vehículos de tracción.



Ventaja: Financiado por los aprendizajes y ventas de la Fase 1.




Mensaje Clave: La versión con servos no elimina la visión futura, la posterga para descomprimir el lanzamiento hoy.

No vendemos solo Hardware. Vendemos una Experiencia.



Hardware

Componentes del Kit.
Experiencia de armado
preciso. Guía de uso inicial.

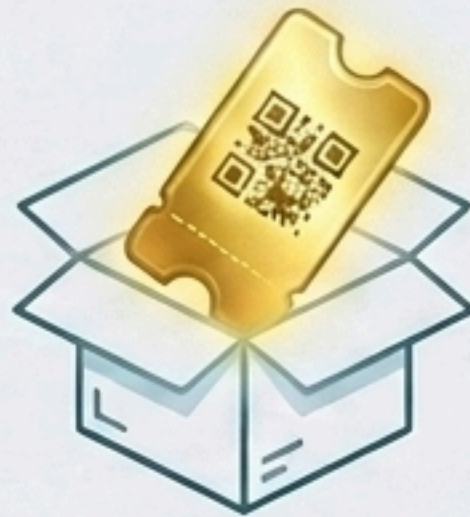

producto pedagógico


Acceso digital exclusivo
(código en el packaging).
Curso autoasistido en
portal propio.




Experiencia Completa

El usuario arma un proyecto
real, entiende la lógica,
aprende a programar paso a
paso y obtiene un certificado.

El Diferencial Pedagógico: Recorrido del Usuario

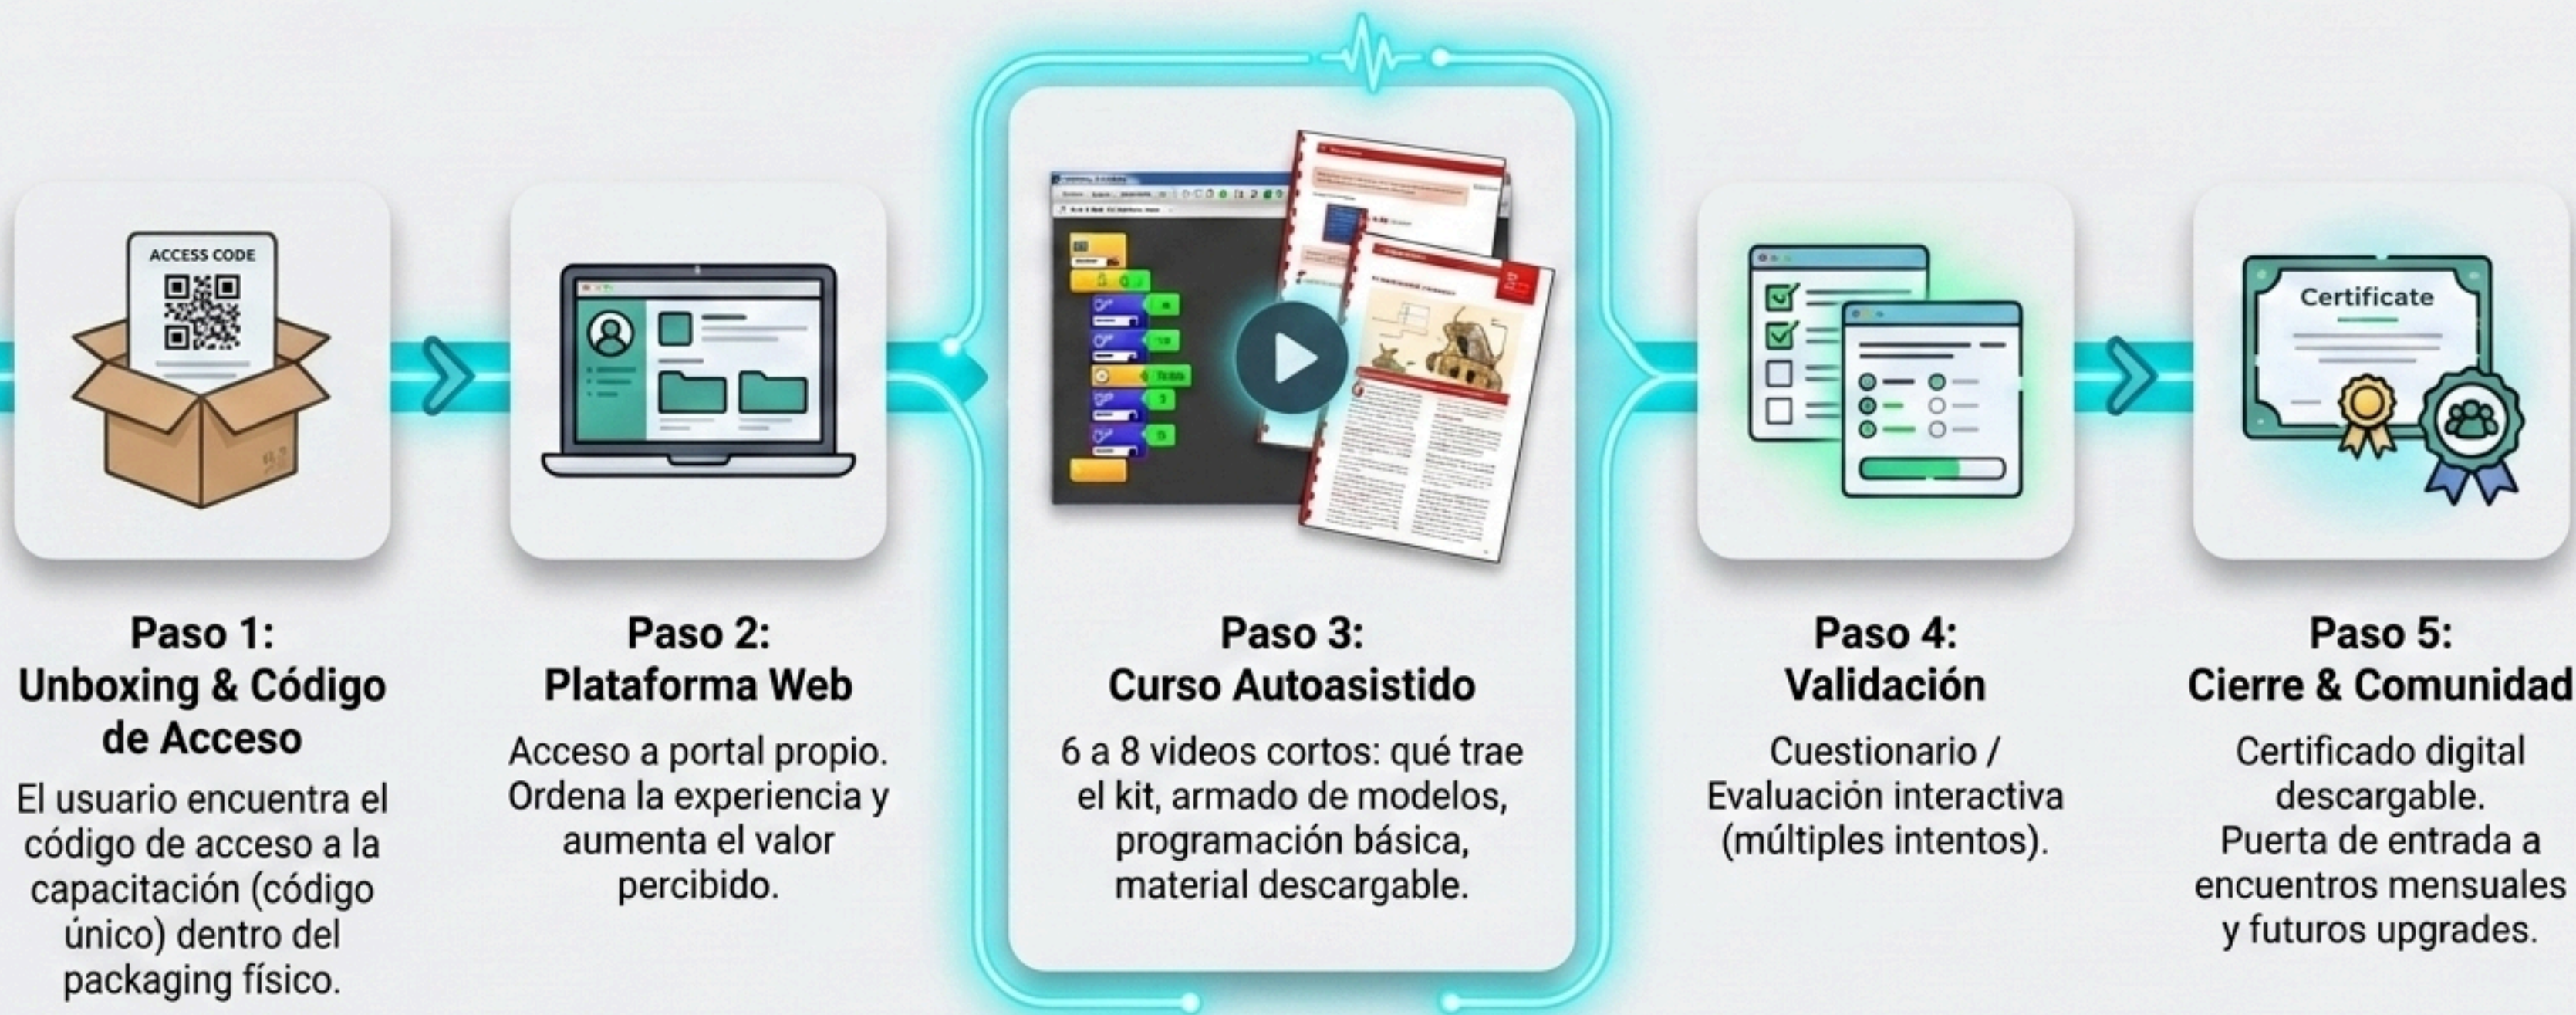

Canales de Comercialización: Estrategia Multicanal

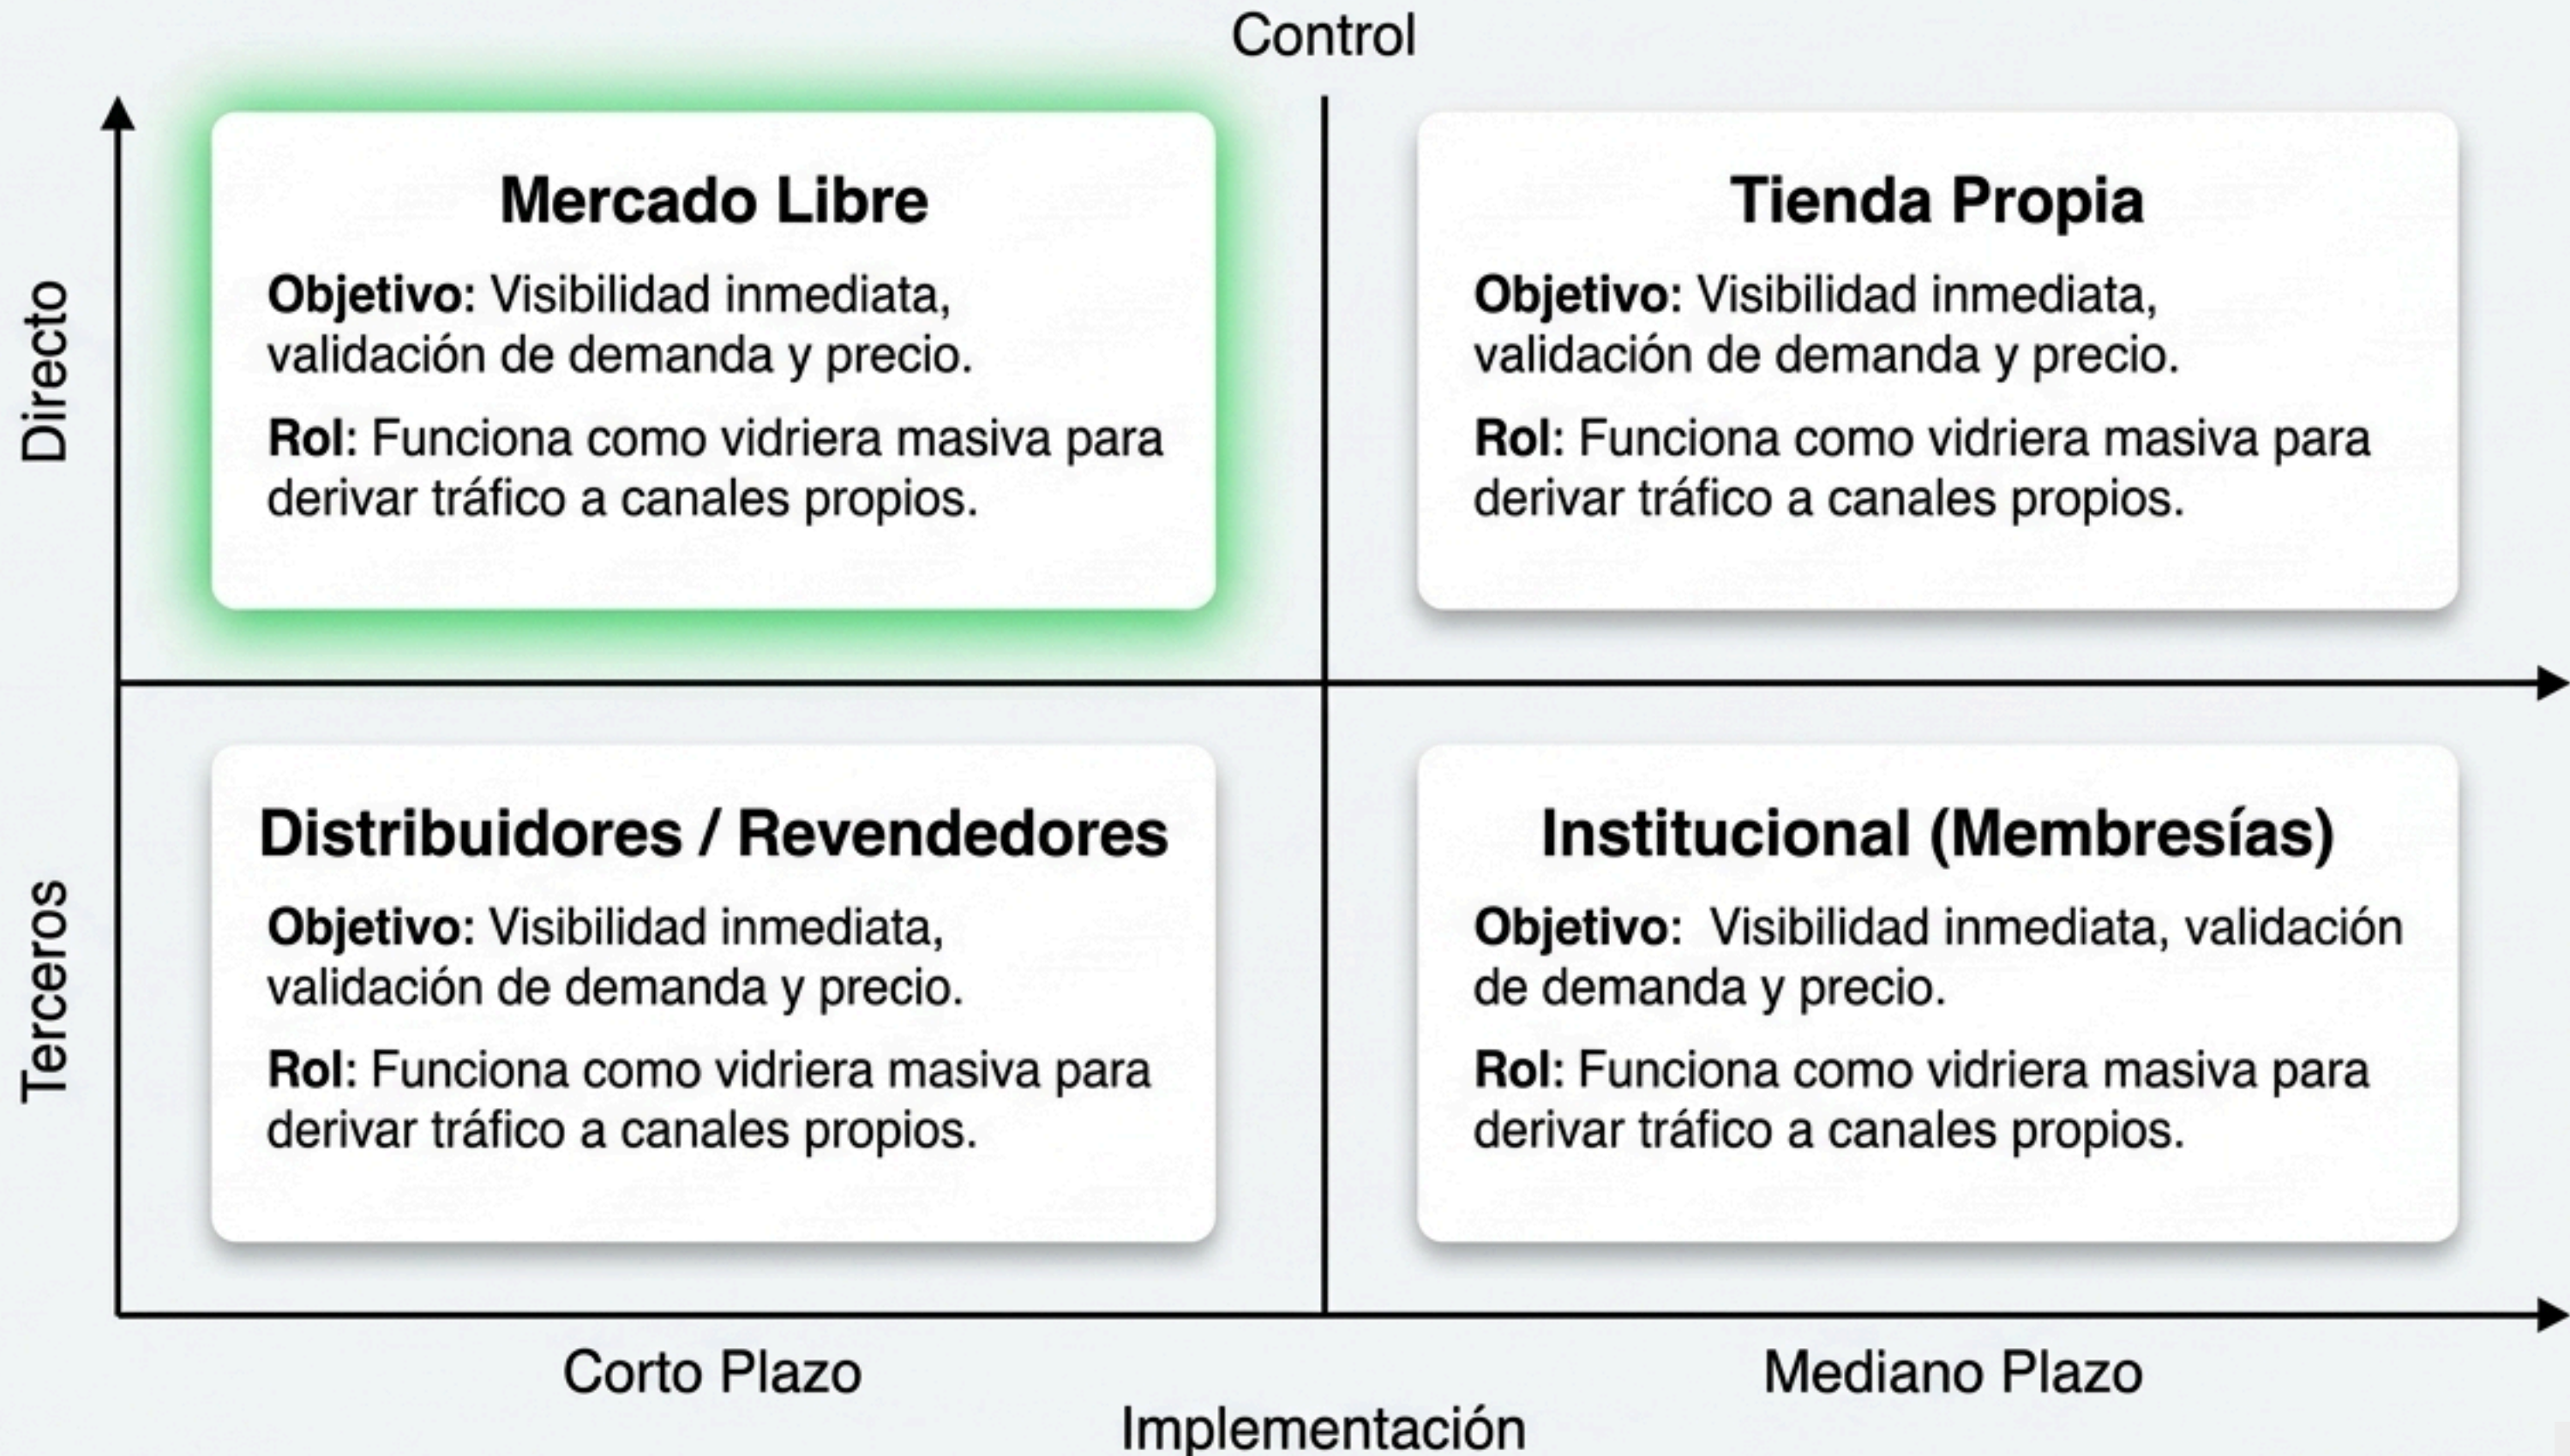

Posicionamiento de Precio: Lanzamiento Fase 1

Datos de Costo

Costo total estimado:
~\$38.000



Ventana comercial ideal:
\$75.000 - \$85.000



Penetración:
Permite entrada
comercial agresiva.



Validación: Ayuda a
mover stock actual
rápidamente.



Percepción: Sostiene
un valor razonable
frente al mercado
genérico.




Flexibilidad: Deja
margen para revisar
al alza en Fase 2.

Filosofía Comercial: No buscamos "maximizar rentabilidad teórica de una vez".
Buscamos lanzar, cobrar, aprender del mercado real y reinvertir.

Base Material y Escenarios Técnicos

Capacidad Máxima Inmediata: 170 kits



Disponibilidad:

Gran parte de componentes relevantes para el escenario 'servos' ya existe.



Faltantes a resolver hoy:

Compra obligatoria de packaging y destornilladores. Revisión de tuercas.

El freno no es conseguir motores, es su compatibilidad con la electrónica actual.

Escenario A (Continuidad)

Conservar la placa actual + buscar motores compatibles.

Compatibilidad

Escenario B (Reformulación)


Nueva placa económica + motores accesibles del mercado.

Roles del Proyecto y Aceleración del Sistema

Operaciones (Sebastián)



Armado, validación
de componentes.



Entregable:
Kits listos.


Motor de Ejecución (Pasantes)

De idea a sistema de
trabajo sostenido.
Ingreso Ideal:
11-18 Mayo.

Comercial (Laureano)



Packaging, canales,
proveedores.




Entregable:
Propuesta comercial.

Pedagógico (Stella)



Producto web,
contenidos didácticos.




Entregable:
Experiencia digital.

Capacidad Real de Ejecución: El Rol de los Pasantes



Diseño Industrial

Mejoras físicas de kits y componentes.
Propuestas de packaging y diseño gráfico.
Generación de una línea de diseño propio a mediano plazo.




Eléctrica

Pruebas y validación de interacción de componentes. Estructura técnica del kit y análisis conjunto de compatibilidades eléctricas.



Informática Web

Desarrollo de tienda propia y plataforma web.
Arquitectura front/back del curso autoasistido, login, gestión de usuarios y emisión de certificados.




Informática Arduino

Programación de robots y código de ejemplo.
Soporte técnico, análisis de placas y propuestas para la evolución técnica (Fase 2).


Roadmap de Ejecución (Mayo - Julio) | Meta: 170 Kits

Producto &
Stock

Pruebas de
componentes




Compra de faltantes
urgentes




Armado progresivo
(170 kits)

Diseño &
Comercial

Desarrollo de
packaging




Prototipo comercial




Estrategia en canales
(Mercado Libre)

Pedagógico
& Web

Guiones del curso



Desarrollo tienda
propia



Validación de
plataforma web



Aclaración Operativa Crítica: El despegue real de estas tareas en paralelo depende estrictamente de la incorporación oficial del equipo de pasantes (Semana 11-18 Mayo).

Escalabilidad B2B: Membresías para Instituciones

Transición de 'Vender un kit y desentendernos' a 'Vender adopción tecnológica mensual'.

Venta Única Tradicional



Membresía B2B
(Valor Recurrente)

La Oferta Base (Ticket sugerido: \$400.000/mes)

- ✓ Kits en uso (1 a 4 según plan) + reposición/reparación garantizada.
- ✓ Acceso a cursos y paquete pedagógico para docentes.
- ✓ Encuentros y talleres periódicos.

El Valor Institucional (Win-Win)

Ticket de entrada bajo para el colegio.

Continuidad pedagógica sin incertidumbre técnica.

Respaldo oficial de la Universidad Nacional (rédito institucional mutuo).

Tablero de Decisiones: Desbloqueando la Fase 1 Hoy

Panel **Producto & Comercial**



Aprobar alcance Fase 1 (Servomotores) para avanzar urgente con prototipos.



Confirmar precio base de lanzamiento (\$79.000).



Definir canal prioritario (Mercado Libre vs. Tienda Propia) y techo de comisión para revendedores.

Panel **Operaciones & Equipo**



Aprobar la compra urgente: Packaging, destornilladores y faltantes menores (tuercas).



Validar los 4 perfiles técnicos de pasantes para ingreso oficial en Mayo.



Aprobar el desarrollo de la propuesta piloto comercial para Municipios (plazo 60 días).

Material	#	Cantidad por caja	Precio por unidad	Precio por piezas en caja	🔍	stock	Cantidad
Placa Duinobot		1	\$9,500.00	\$9,500.00	si		170
Servomotor		3	\$3,500.00	\$3,500.00	si		>1000
leds		3	\$1,000.00	\$3,000.00	si		370
Fotorresistencia LDR		1	\$3,000.00	\$3,000.00	si		527
Buzzers		1	\$4,500.00	\$4,500.00	si		500
Sensor Ultrasónico		1	\$3,029.00	\$3,029.00	si		137
Kit cable dupont m/m		5	\$3,700.00	\$3,700.00	si		>1000
Llave para tuercas		1	\$1,000.00	\$1,000.00	si		500
Plásticos y tornilleria		?			si		>1000
Portapílas		1	\$2,000.00		no		A comprar
Destornillador			\$2,500.00	\$2,500.00	no		A comprar
Packaging		1	\$5,000.00	\$5,000.00	no		A comprar
			\$38,729.00	\$38,729.00			
